



PROYECTO TESTING PRESTASHOP

PLAN DE PRUEBAS

Josué Legeon
Ingeniero de Calidad de software



INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Campo	Detalle
Proyecto	Testing de Funcionalidades Principales Prestashop Demo
Documento	Plan de Pruebas (Test Plan)
Versión	1.0
Autor	Josué Legeon
Fecha de Creación	08-Nov-2024
Última Actualización	08-Nov-2024
Estado	Aprobado
Clasificación	Confidencial

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Aprobador
0.1	06-Nov-2024	Josué Legeon	Borrador inicial	-
0.5	07-Nov-2024	Josué Legeon	Revisión y ajustes	Josué Legeon
1.0	08-Nov-2024	Josué Legeon	Versión final aprobada	Josué Legeon



TABLA DE CONTENIDOS

1. *IDENTIFICADOR DEL PLAN DE PRUEBAS*
2. *REFERENCIAS*
3. *INTRODUCCIÓN*
4. *ELEMENTOS A PROBAR*
5. *CARACTERÍSTICAS A PROBAR*
6. *CARACTERÍSTICAS NO A PROBAR*
7. *ENFOQUE DE PRUEBAS*
8. *CRITERIOS DE APROBACIÓN/RECHAZO*
9. *CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN*
10. *ENTREGABLES DE PRUEBAS*
11. *TAREAS DE PRUEBAS*
12. *NECESIDADES AMBIENTALES*
13. *RESPONSABILIDADES*
14. *CRONOGRAMA*
15. *RIESGOS Y CONTINGENCIAS*



1. IDENTIFICADOR DEL PLAN DE PRUEBAS

1.1. Información General

Campo	Detalle
ID del Plan	TP-PRESTASHOP-001
Proyecto	Prestashop Demo Testing
Release	Demo Version (Current)
Tipo de Testing	Functional Testing Manual
Nivel	System Testing
Ciclo	Cycle 1 - Initial Testing
Fecha Inicio	20-Sep-2024
Fecha Fin	25-Oct-2024
Duración	35 días laborables
QA Lead	Josué Legeon

1.2. Objetivos del Plan

Objetivo	Descripción	Métrica de Éxito
Validación Funcional	Verificar que todas las funcionalidades críticas operen correctamente	100% funcionalidades P0-P1 probadas
Detección de Defectos	Identificar y documentar defectos del sistema	Mínimo 10 defectos documentados
Cobertura Completa	Asegurar cobertura total del alcance definido	100% casos de prueba ejecutados
Calidad de Evidencias	Documentar resultados con evidencias profesionales	100% casos con screenshots
Certificación	Emitir certificación de calidad del sistema	0 defectos críticos abiertos

2. REFERENCIAS

2.1. Documentos del Proyecto

ID	Documento	Versión
DOC-001	Alcance del Proyecto	1.1
DOC-002	Estrategia de Testing	1.0
DOC-003	Plan de Pruebas	1.0
DOC-004	Requisitos Funcionales	1.0
DOC-005	Matriz de Trazabilidad	1.0
DOC-006	Casos de Prueba	1.0

2.2. Estándares y Normas

- **IEEE 829-2008** - Standard for Software Test Documentation
- **ISTQB CTFL** - Certified Tester Foundation Level Syllabus
- **ISO/IEC/IEEE 29119** - Software Testing Standards



3. INTRODUCCIÓN

3.1. Propósito

Este Plan de Pruebas describe el enfoque, recursos, cronograma y actividades necesarias para realizar el testing del sitio **Prestashop Demo Store**. El plan establece las bases para la ejecución sistemática de pruebas funcionales manuales, asegurando que el sistema cumpla con los requisitos esperados y proporcione una experiencia de usuario óptima.

3.2. Alcance del Plan

Este plan cubre:

Incluido:

- Pruebas funcionales de módulos principales
- Pruebas de regresión básica
- Pruebas exploratorias
- Pruebas de usabilidad
- Pruebas de compatibilidad cross-browser
- Pruebas de responsividad (Desktop, Tablet, Mobile)

Excluido:

- Testing del panel de administración (Back Office)
- Pruebas de seguridad o penetración
- Pruebas de rendimiento o carga
- Pruebas de API
- Integración con pasarelas de pago reales
- Pruebas de accesibilidad (WCAG)

3.3. Audiencia

Rol	Uso del Documento
QA Lead/Tester	Guía operacional para ejecución de pruebas
Reclutadores	Evaluación de habilidades de QA
Stakeholders	Visibilidad del progreso y resultados
Revisores Técnicos	Evaluación de metodología y profesionalismo

4. ELEMENTOS A PROBAR

4.1. Aplicación Bajo Prueba

SISTEMA: Prestashop Demo Store	
Información General:	Componentes Principales:
URL Principal: https://demo.prestashop.com	Frontend (Customer Facing) • Catálogo de Productos • Sistema de Carrito • Proceso de Checkout • Autenticación de Usuario • Navegación y Búsqueda
Tipo: E-commerce Web Application	
Plataforma: Prestashop CMS	
Versión: Demo (Noviembre)	



Ambiente: Production Demo

Backend (Fuera de alcance)

4.2. Identificación de Versión

Atributo	Valor
Build/Release	Demo Production
Fecha de Snapshot	20-Sep-2024
Prestashop Version	8.x
PHP Version	7.4+
Database	MySQL (no accesible)

5. CARACTERÍSTICAS A PROBAR

5.1. Módulos Funcionales en Alcance

Tabla de Módulos

ID	Módulo	Prioridad	Complejidad	Casos Estimados	Cobertura
M01	Autenticación y Registro	● P0	Media	15	100%
M02	Catálogo de Productos	● P0	Alta	20	100%
M03	Búsqueda y Filtros	● P1	Alta	18	100%
M04	Carrito de Compras	● P0	Alta	22	100%
M05	Proceso de Checkout	● P0	Muy Alta	25	100%
M06	Detalle de Producto	● P1	Media	12	100%
M07	Navegación del Sitio	● P2	Baja	10	100%
M08	Responsividad	● P2	Media	8	80%

Total de Casos de Prueba Estimados: 130 casos

5.2. Funcionalidades Detalladas por Módulo

M01 - Autenticación y Registro

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
AUTH-001	Registro de Usuario	Crear nueva cuenta con email y contraseña
AUTH-002	Login de Usuario	Acceso con credenciales válidas
AUTH-003	Logout de Usuario	Cerrar sesión correctamente
AUTH-004	Validación de Formulario	Campos obligatorios y formatos
AUTH-005	Mensajes de Error	Credenciales inválidas, usuario existente
AUTH-006	Recuperación de Contraseña	Reset password flow (si disponible)

M02 - Catálogo de Productos

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
CAT-001	Listado de Productos	Visualización de productos por categoría
CAT-002	Paginación	Navegación entre páginas de resultados
CAT-003	Productos por Página	Selector de cantidad (12/24/36)
CAT-004	Vista de Producto	Grid view vs List view
CAT-005	Información de Producto	Nombre, precio, imagen, disponibilidad
CAT-006	Navegación por Categorías	Menú de categorías funcional



M03 - Búsqueda y Filtros

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
SEARCH-001	Búsqueda por Palabra Clave	Search box funcional
SEARCH-002	Autocompletado	Sugerencias mientras se escribe
SEARCH-003	Resultados de Búsqueda	Productos relevantes mostrados
SEARCH-004	Búsqueda Sin Resultados	Mensaje apropiado cuando no hay matches
FILTER-001	Filtro por Precio	Rango de precios
FILTER-002	Filtro por Categoría	Filtrar por tipo de producto
FILTER-003	Filtro por Marca	Filtrar por fabricante
FILTER-004	Ordenamiento	Precio, nombre, popularidad

M04 - Carrito de Compras

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
CART-001	Agregar Producto	Añadir producto desde listado
CART-002	Agregar desde Detalle	Añadir desde página de producto
CART-003	Ver Carrito	Visualizar contenido del carrito
CART-004	Modificar Cantidad	Incrementar/decrementar cantidad
CART-005	Eliminar Producto	Remover producto del carrito
CART-006	Cálculo de Subtotal	Suma correcta de productos
CART-007	Cálculo de Total	Total incluyendo impuestos/envío
CART-008	Carrito Vacío	Mensaje cuando no hay productos
CART-009	Continuar Comprando	Botón funcional de vuelta al catálogo
CART-010	Mini-carrito	Widget de carrito en header

M05 - Proceso de Checkout

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
CHECK-001	Inicio de Checkout	Botón "Proceder al pago"
CHECK-002	Validación de Login	Requiere usuario logueado
CHECK-003	Dirección de Envío	Formulario de dirección
CHECK-004	Validación de Dirección	Campos obligatorios
CHECK-005	Método de Envío	Selección de opciones de envío
CHECK-006	Método de Pago	Selección de forma de pago
CHECK-007	Resumen de Orden	Revisión antes de confirmar
CHECK-008	Términos y Condiciones	Checkbox de aceptación
CHECK-009	Confirmación de Orden	Orden creada exitosamente
CHECK-010	Número de Orden	Generación de ID único

M06 - Detalle de Producto

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
PROD-001	Galería de Imágenes	Múltiples imágenes del producto
PROD-002	Zoom de Imagen	Ampliar imagen al hover/click
PROD-003	Descripción	Información detallada del producto
PROD-004	Precio	Precio actual y descuentos
PROD-005	Disponibilidad	Stock disponible
PROD-006	Variantes	Selección de color, tamaño, etc.
PROD-007	Cantidad	Selector de cantidad
PROD-008	Botón Añadir al Carrito	Agregar desde detalle



M07 - Navegación del Sitio

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
NAV-001	Menú Principal	Navegación por categorías
NAV-002	Breadcrumbs	Ruta de navegación
NAV-003	Footer	Enlaces informativos
NAV-004	Logo	Volver a home
NAV-005	Enlaces Internos	Funcionamiento correcto

M08 - Responsividad

Feature ID	Funcionalidad	Descripción
RESP-001	Desktop View	Correcto en 1920x1080
RESP-002	Laptop View	Correcto en 1366x768
RESP-003	Tablet View	Correcto en 768x1024
RESP-004	Mobile View	Correcto en 375x667

5.2.1. 5.3 Matriz de Priorización

Matriz de Priorización de Módulos				
Prioridad	Descripción	Módulo ID	Nombre del Módulo	Orden de Ejecución
● P0 - CRÍTICO	Ejecución inmediata. Impacta directamente la funcionalidad principal del sistema.	M01	Autenticación	1
		M02	Catálogo	1
		M04	Carrito	1
		M05	Checkout	1
● P1 - ALTO	Alta prioridad. Importante para la experiencia de usuario o integración de procesos.	M03	Búsqueda y Filtros	2
		M06	Detalle de Producto	2
● P2 - MEDIO	Prioridad media. Funcionalidades complementarias o de soporte.	M07	Navegación	3
		M08	Responsividad	3

6. CARACTERÍSTICAS NO A PROBAR

6.1. Módulos Excluidos

Módulo	Razón de Exclusión
Backend/Admin Panel	Fuera de alcance - Enfoque en Front Office
API Endpoints	Sin acceso a documentación de API
Base de Datos	Sin acceso directo
Configuración de Módulos	Requiere acceso administrativo
Integraciones de Pago	Demo no procesa pagos reales
Email System	Emails transaccionales no verificables
Reporting/Analytics	Requiere backend access

6.2. Tipos de Testing Excluidos

Tipo de Testing	Justificación
Performance Testing	Requiere herramientas especializadas, fuera de alcance
Load Testing	No aplicable a ambiente demo
Security Testing	Requiere herramientas y expertise especializado



Penetration Testing	Fuera de alcance ético y técnico
Accessibility Testing	No es objetivo del proyecto
Internationalization	Demo en un solo idioma
Unit Testing	Sin acceso a código fuente
Integration Testing (API)	APIs no documentadas/accesibles

6.3. Funcionalidades No Probadas

- Panel de administración (BackOffice)
- Gestión de inventario
- Procesamiento de pagos reales
- Envío de emails de confirmación
- Gestión de usuarios admin
- Reportes y estadísticas
- Configuración de tienda
- Módulos y plugins custom

7. ENFOQUE DE PRUEBAS

7.1. Metodología de Testing

7.1.1. Enfoque General

Fase	Nombre de la Fase	Duración Estimada	Actividades Principales
Fase 1	Smoke Testing	Día 1	- Validar funcionalidades básicas críticas
Fase 2	Scripted Testing	Días 2 – 8	- Ejecución de casos de prueba predefinidos - Seguimiento de checklist - Pruebas basadas en requisitos
Fase 3	Exploratory Testing	Días 9 – 10	- Sesiones de exploración estructuradas - Bug hunting - Validación de usabilidad
Fase 4	Regression Testing	Día 10	- Re-ejecución de casos críticos

7.1.2. Distribución de Esfuerzo

Tipo de Testing	% Esfuerzo	Casos	Descripción
Smoke Testing	5%	10	Funcionalidades básicas críticas
Functional Testing	60%	90	Casos de prueba detallados
Exploratory Testing	20%	-	Sesiones ad-hoc estructuradas
Regression Testing	15%	30	Re-ejecución de casos P0-P1

7.2. Tipos de Pruebas

7.2.1. Pruebas Funcionales

Objetivo: Validar que cada funcionalidad opere según requisitos

**Técnicas:**

- Pruebas de caja negra
- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Decision Tables
- State Transition Testing

Cobertura: 100% de funcionalidades en alcance

7.2.2. Pruebas de Regresión

Objetivo: Asegurar que funcionalidades existentes no se rompan

Alcance:

- Suite de regresión: 30 casos críticos
- Ejecución: Después de cada fase de testing
- Enfoque: Flujos end-to-end principales

7.2.3. Pruebas Exploratorias

Objetivo: Descubrir defectos no previstos

Enfoque:

- Sesiones de 60-90 minutos
- Charter-based testing
- Focus en usabilidad y UX
- Documentación de hallazgos

7.2.4. Pruebas de Usabilidad

Objetivo: Evaluar facilidad de uso

Criterios:

- Intuitividad de navegación
- Claridad de mensajes
- Consistencia visual
- Accesibilidad básica

7.2.5. Pruebas de Compatibilidad

Navegadores a Probar:

Navegador	Versiones	Sistema Operativo	Prioridad
Chrome	119, 120	Windows 11	● Alta
Firefox	120, 121	Windows 11	● Alta
Edge	119, 120	Windows 11	● Media
Safari (**)	17.x	macOS Sonoma	● Media



7.2.6. Pruebas de Responsividad

Resoluciones a Probar:

Dispositivo	Resolución	Orientación	Prioridad
Desktop FHD	1920x1080	Landscape	● Alta
Laptop	1366x768	Landscape	● Alta
Tablet (iPad)	768x1024	Portrait/Landscape	● Media
Mobile (iPhone)	375x667	Portrait	● Media
Mobile (Android)	360x640	Portrait	● Baja

7.3. Técnicas de Diseño de Casos de Prueba

7.3.1. Equivalence Partitioning

Aplicado a: Campos de formulario, validaciones

Ejemplo: Campo Email

- Partición Válida: email@domain.com
- Partición Inválida: sin @, sin dominio, vacío

7.3.2. Boundary Value Analysis

Aplicado a: Cantidades, límites numéricos

Ejemplo: Cantidad de Productos

- Valores límite: 0, 1, 99, 100, 101
- Enfoque en min-1, min, max, max+1

7.3.3. Decision Tables

Aplicado a: Lógica de negocio compleja


Ejemplo: Checkout

- Usuario logueado: Sí/No
- Dirección guardada: Sí/No
- Método de pago: Válido/Inválido
- Resultado esperado basado en combinaciones

7.3.4. State Transition

Aplicado a: Estados del carrito, proceso de compra

Estados del Carrito:





7.4. Niveles de Testing

Nivel	Aplicable	Responsable	Herramientas
Unit Testing	No	N/A	N/A
Integration Testing	Sí	QA Lead	Manual
System Testing	Sí	QA Lead	Manual
Acceptance Testing	Sí	QA Lead	Manual

8. CRITERIOS DE APROBACIÓN/RECHAZO

8.1. Criterios de Aceptación (Pass Criteria)

El testing se considerará **EXITOSO** si se cumplen todos los siguientes criterios:

#	Criterio	Umbral	Medición
1	Ejecución Completa	100%	Todos los casos ejecutados
2	Tasa de Éxito	$\geq 90\%$	$(\text{Casos pasados} / \text{Total ejecutados}) \times 100$
3	Defectos Críticos	0	Defectos S1 sin resolver
4	Defectos Altos	≤ 2	Defectos S2 sin resolver
5	Funcionalidades P0	100%	Todas las críticas funcionan
6	Funcionalidades P1	$\geq 95\%$	High priority features funcionan
7	Cobertura de Requisitos	100%	Todos los requisitos probados
8	Evidencias	100%	Todos los casos con screenshots
9	Documentación	100%	Todos los entregables completados
10	Smoke Tests	100%	Todos pasados

8.2. Criterios de Rechazo (Fail Criteria)

El testing se considerará **FALLIDO** si:

#	Condición de Fallo	Severidad	Acción
1	Más de 3 defectos S1 (críticos) encontrados	Crítica	Suspender testing
2	Más de 50% de casos de prueba fallan	Crítica	Suspender testing
3	Tasa de éxito $< 80\%$	Alta	Extender ciclo de testing
4	Funcionalidades P0 no operan	Crítica	Suspender testing
5	Más de 5 defectos S2 sin resolver	Alta	No aprobar release
6	Ambiente no disponible > 48 horas	Alta	Suspender y reevaluar

8.3. Definición de Severidades

Severidad	Definición	Ejemplo	Impacto
S1 - Crítica	Sistema no funcional, bloqueante	Sitio no carga, checkout roto	Testing detenido
S2 - Alta	Funcionalidad principal afectada	Carrito no calcula total	Requiere fix urgente
S3 - Media	Funcionalidad secundaria afectada	Filtro no funciona	Fix en este ciclo
S4 - Baja	Cosmético, typo	Texto mal alineado	Fix cuando sea posible

9. CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN



9.1. Criterios de Suspensión

El testing será **SUSPENDIDO** inmediatamente si:

#	Criterio	Descripción	Responsable
1	Ambiente No Disponible	Sitio demo caído por más de 4 horas consecutivas	QA Lead
2	Defectos Bloqueantes	Más de 3 defectos S1 que impiden continuar	QA Lead
3	Smoke Test Fallido	Más del 50% de smoke tests fallan	QA Lead
4	Cambios Mayores	Actualizaciones significativas en el sitio demo	QA Lead
5	Pérdida de Datos	Pérdida crítica de casos de prueba o evidencias	QA Lead
6	Problemas de Seguridad	Vulnerabilidad crítica detectada	QA Lead

9.2. Acciones Durante Suspensión

Cuando el testing esté suspendido:

Acciones Inmediatas:

1. Documentar razón de suspensión con timestamp
2. Notificar a stakeholders
3. Preservar evidencias existentes
4. Documentar el estado actual del testing
5. Crear backup de todo el trabajo

Actividades Alternativas:

1. Trabajar en documentación pendiente
2. Revisar y mejorar casos de prueba existentes
3. Analizar defectos ya encontrados
4. Preparar reportes preliminares
5. Actualizar matriz de trazabilidad

9.3. Criterios de Reanudación

El testing podrá **REANUDARSE** cuando:

#	Criterio	Verificación	Responsable
1	Ambiente Restaurado	Sitio accesible y funcionando por 2+ horas	QA Lead
2	Defectos Bloqueantes Resueltos	Verificación de fixes en ambiente	QA Lead
3	Smoke Tests Pasados	Re-ejecución exitosa de smoke tests	QA Lead
4	Cambios Documentados	Nuevas funcionalidades documentadas	QA Lead
5	Datos Recuperados	Backup restaurado o datos recreados	QA Lead
6	Aprobación Formal	Go-ahead de stakeholders	QA Lead

10. ENTREGABLES DE PRUEBAS

10.1. Entregables de Planificación

#	Entregable	Formato	Responsable	Estado	Fecha Entrega
---	------------	---------	-------------	--------	---------------



E01	Alcance del Proyecto	Markdown	QA Lead	Completo	23-Sep-2024
E02	Estrategia de Testing	Markdown	QA Lead	Completo	08-Nov-2024
E03	Plan de Pruebas	Markdown	QA Lead	Completo	08-Nov-2024
E04	Requisitos Funcionales	Markdown/Excel	QA Lead	En Progreso	15-Sep-2024
E05	Matriz de Trazabilidad	Excel/Sheets	QA Lead	En Progreso	18-Sep-2024

10.2. Entregables de Diseño

#	Entregable	Formato	Responsable	Estado	Fecha Entrega
E06	Casos de Prueba Detallados	Excel/Sheets	QA Lead	En Progreso	28-Sep-2024
E07	Checklist de Funcionalidades	Excel/Sheets	QA Lead	En Progreso	25-Sep-2024
E08	Escenarios de Prueba	Document	QA Lead	En Progreso	26-Sep-2024
E09	Datos de Prueba	Excel/CSV	QA Lead	En Progreso	27-Sep-2024
E10	Mind Map del Sistema	Draw.io/Image	QA Lead	En Progreso	24-Sep-2024

10.3. Entregables de Ejecución

#	Entregable	Formato	Responsable	Estado	Fecha Entrega
E11	Reporte de Ejecución Diario	PDF/Markdown	QA Lead	Pendiente	Diario
E12	Log de Defectos	Excel/GitHub Issues	QA Lead	Pendiente	Continuo
E13	Evidencias (Screenshots)	PNG/JPG	QA Lead	Pendiente	Continuo
E14	Evidencias (Videos)	MP4	QA Lead	Pendiente	Según necesidad
E15	Logs del Sistema	TXT/LOG	QA Lead	Pendiente	Según necesidad

10.4. Entregables de Reporte

#	Entregable	Formato	Responsable	Estado	Fecha Entrega
E16	Reporte Semanal de Progreso	PDF/Presentation	QA Lead	Pendiente	Semanal
E17	Dashboard de Métricas	Excel/Image	QA Lead	Pendiente	Semanal
E18	Reporte de Defectos Consolidado	Excel/PDF	QA Lead	Pendiente	12-Oct-2024
E19	Reporte Final de Testing	PDF/Presentation	QA Lead	Pendiente	14-Oct-2024
E20	Certificación de Calidad	PDF	QA Lead	Pendiente	14-Oct-2024

10.5. Entregables Adicionales

#	Entregable	Formato	Responsable	Estado	Fecha Entrega
E21	Repositorio GitHub Completo	Git Repo	QA Lead	En Progreso	25-Oct-2024
E22	README del Proyecto	Markdown	QA Lead	En Progreso	24-Oct-2024
E23	Lecciones Aprendidas	Document	QA Lead	Pendiente	23-Oct-2024
E24	Presentación Ejecutiva	PowerPoint	QA Lead	Pendiente	25-Oct-2024

11.TAREAS DE PRUEBAS

11.1. Fase 1: Planificación (Días 1-5)

ID	Tarea	Duración	Dependencias	Responsable	Entregable
T01	Revisar y aprobar alcance del proyecto	1 día	-	QA Lead	DOC-001



T02	Crear estrategia de testing	2 días	T01	QA Lead	DOC-002
T03	Desarrollar plan de pruebas	2 días	T02	QA Lead	DOC-003
T04	Identificar y documentar requisitos	1 día	T01	QA Lead	DOC-004
T05	Configurar herramientas	1 día	-	QA Lead	-

11.2. Fase 2: Diseño (Días 6-12)

ID	Tarea	Duración	Dependencias	Responsable	Entregable
T06	Diseñar casos de prueba - Autenticación	1 día	T04	QA Lead	15 casos
T07	Diseñar casos de prueba - Catálogo	1.5 días	T04	QA Lead	20 casos
T08	Diseñar casos de prueba - Búsqueda	1.5 días	T04	QA Lead	18 casos
T09	Diseñar casos de prueba - Carrito	2 días	T04	QA Lead	22 casos
T10	Diseñar casos de prueba - Checkout	2 días	T04	QA Lead	25 casos
T11	Diseñar casos de prueba - Detalle Producto	1 día	T04	QA Lead	12 casos
T12	Diseñar casos de prueba - Navegación	0.5 días	T04	QA Lead	10 casos
T13	Diseñar casos de prueba - Responsividad	0.5 días	T04	QA Lead	8 casos
T14	Crear matriz de trazabilidad	1 día	T06-T13	QA Lead	DOC-005
T15	Revisar y aprobar casos de prueba	1 día	T14	QA Lead	-

11.3. Fase 3: Preparación (Días 13-14)

ID	Tarea	Duración	Dependencias	Responsable	Entregable
T16	Preparar ambiente de testing	0.5 días	-	QA Lead	-
T17	Configurar navegadores	0.5 días	-	QA Lead	-
T18	Crear datos de prueba	1 día	-	QA Lead	Test Data
T19	Configurar herramientas de captura	0.5 días	-	QA Lead	-
T20	Ejecutar smoke tests	0.5 días	T16-T19	QA Lead	Smoke Results

11.4. Fase 4: Ejecución (Días 15-24)

ID	Tarea	Duración	Dependencias	Responsable	Entregable
T21	Ejecutar casos P0 - Módulos críticos	3 días	T20	QA Lead	Evidencias
T22	Ejecutar casos P1 - Alta prioridad	3 días	T21	QA Lead	Evidencias
T23	Ejecutar casos P2 - Media prioridad	2 días	T22	QA Lead	Evidencias
T24	Ejecutar pruebas exploratorias	2 días	T23	QA Lead	Bug Reports
T25	Ejecutar pruebas de regresión	1 día	T24	QA Lead	Evidencias
T26	Re-test de defectos encontrados	1 día	T21-T25	QA Lead	Re-test Results
T27	Reportar defectos (continuo)	10 días	T21	QA Lead	Defect Log
T28	Generar reportes diarios	10 días	T21	QA Lead	Daily Reports

11.5. Fase 5: Reporte (Días 25-28)

ID	Tarea	Duración	Dependencias	Responsable	Entregable
T29	Consolidar resultados de ejecución	1 día	T26	QA Lead	Consolidated Results



T30	Analizar métricas de testing	1 día	T29	QA Lead	Metrics Dashboard
T31	Crear reporte final de testing	2 días	T30	QA Lead	Final Report
T32	Generar certificación de calidad	0.5 días	T31	QA Lead	QA Certificate
T33	Preparar presentación ejecutiva	1 día	T31	QA Lead	Presentation

11.6. Fase 6: Cierre (Días 29-35)

ID	Tarea	Duración	Dependencias	Responsable	Entregable
T34	Documentar lecciones aprendidas	1 día	T33	QA Lead	Lessons Learned
T35	Organizar repositorio GitHub	2 días	T34	QA Lead	Git Repo
T36	Crear README completo	1 día	T35	QA Lead	README.md
T37	Archivar todos los artefactos	1 día	T36	QA Lead	Archive
T38	Revisión final de calidad	1 día	T37	QA Lead	-
T39	Cierre formal del proyecto	1 día	T38	QA Lead	Sign-off

11.6.1. 11.7 Diagrama de Gantt Simplificado

CRONOGRAMA DE TAREAS (35 DÍAS)

Actividad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35
Planificación	■				
Diseño	■	■			
Preparación		■			
Smoke Testing		■			
Ejecución P0-P1			■		
Reporte diario			■		
Ejecución P2-P3				■	
Testing Exploratorio				■	
Regresión				■	
Reportes				■	
Cierre y Documentación					■
Presentación					■

Distribución Detallada por Días

Actividad	Inicio	Fin	Duración
Planificación	Día 1	Día 7	7 días
Diseño	Día 4	Día 14	11 días
Preparación	Día 12	Día 14	3 días
Smoke Testing	Día 14	Día 15	2 días
Ejecución P0-P1	Día 15	Día 21	7 días
Reporte diario	Día 15	Día 21	7 días
Ejecución P2-P3	Día 22	Día 25	4 días
Testing Exploratorio	Día 23	Día 26	4 días
Regresión	Día 25	Día 27	3 días



Reportes	Día 26	Día 28	3 días
Cierre y Documentación	Día 29	Día 35	7 días
Presentación	Día 33	Día 35	3 días

12. NECESIDADES AMBIENTALES

12.1. Ambiente de Testing

12.1.1. Especificaciones del Ambiente

Componente	Especificación	Disponibilidad
URL Base	https://demo.prestashop.com/	24/7 (sujeto a mantenimiento)
Tipo	Demo Production Environment	Público
Versión	Prestashop 8.x (Latest Stable Demo)	Actualizado periódicamente
Acceso	Sin autenticación requerida	Abierto
Limitaciones	Sin acceso a backend, datos demo	Conocidas
Backup	No aplicable (ambiente demo)	N/A

12.1.2. Configuración de Hardware

Estación de Trabajo del Tester:

Componente	Especificación Mínima	Especificación Recomendada
Procesador	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
RAM	8 GB	16 GB
Almacenamiento	256 GB SSD	512 GB SSD
Monitor	1920x1080 (Full HD)	1920x1080 o superior
Internet	10 Mbps estable	25 Mbps o superior
Sistema Operativo	Windows 10 / macOS 11	Windows 11 / macOS 13+

12.1.3. Software Requerido

Software	Versión	Propósito	Licencia
Google Chrome	119+	Testing cross-browser	Gratuita
Mozilla Firefox	120+	Testing cross-browser	Gratuita
Microsoft Edge	119+	Testing cross-browser	Gratuita
Safari (**)	17+	Testing cross-browser (macOS)	Gratuita
Google Sheets/Excel	Latest	Gestión de casos y métricas	Gratuita/Comercial
Lightshot	5.5+	Capturas de pantalla	Gratuita
OBS Studio	29+	Grabación de videos	Open Source
Git	2.40+	Control de versiones	Open Source
VS Code	Latest	Edición de documentos	Gratuita
Draw.io	Web	Diagramas y mind maps	Gratuita



12.2. Datos de Prueba

12.2.1. Usuarios de Prueba

USUARIOS ESTÁNDAR PARA TESTING

Usuario 1 - Nuevo Registro:

- Email: test_user_[timestamp]@prestashop.test
- Password: TestUser123!
- First Name: Test
- Last Name: User

Usuario 2 - Usuario Existente:

- Email: qa.test@prestashop.test
- Password: QA_Test2024!
- First Name: QA
- Last Name: Tester

Usuario 3 - Checkout Testing:

- Email: checkout.test@prestashop.test
- Password: Checkout123!
- First Name: Checkout
- Last Name: Test

12.2.2. Datos de Tarjetas de Crédito (Demo)

TARJETA VISA (DEMO):

- Número: 4111 1111 1111 1111
- Expiración: 12/25
- CVV: 123
- Nombre: TEST CARDHOLDER

TARJETA MASTERCARD (DEMO):

- Número: 5555 5555 5555 4444
- Expiración: 06/26
- CVV: 456
- Nombre: TEST CARDHOLDER

12.2.3. Direcciones de Prueba

DIRECCIÓN ESPAÑA:

- Nombre Completo: Juan Pérez García
- Dirección: Calle Principal, 123
- Ciudad: Madrid
- Código Postal: 28001
- País: España
- Teléfono: +34 912 345 678
- Región: Madrid

DIRECCIÓN CHILE:

- Nombre Completo: María González Rodríguez
- Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 456
- Ciudad: Santiago
- Código Postal: 8320000
- País: Chile



— Teléfono: +56 9 1234 5678
— Región: Región Metropolitana

12.3. Configuración de Navegadores

12.3.1. Chrome

CONFIGURACIÓN PARA TESTING:

- Deshabilitar extensiones de terceros
- Limpiar cache antes de cada sesión
- Cookies habilitadas JavaScript habilitado
- Ventana en modo incógnito (opcional para tests aislados)
- DevTools abierto para logs (cuando sea necesario)

12.3.2. Firefox

CONFIGURACIÓN PARA TESTING:

- Modo normal (no privado para sesiones estándar)
- Limpiar cache antes de cada sesión
- Cookies habilitadas
- Tracking protection deshabilitado
- JavaScript habilitado

12.4. Herramientas y Utilidades

12.4.1. Herramientas de Captura

Herramienta	Uso	Configuración
Lightshot	Screenshots rápidos	Hotkey: Print Screen
OBS Studio	Grabación de videos	1080p, 30fps, MP4 format

12.4.2. Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Uso	Acceso
Chrome DevTools	Inspeccionar elementos, ver logs	F12
Firefox Developer Tools	Debugging, network analysis	F12
Browser Extensions	Ninguna (para evitar interferencias)	N/A

12.5. Conectividad y Acceso

12.5.1. Requisitos de Red


Requisito	Especificación
Velocidad Mínima	10 Mbps download / 5 Mbps upload
Latencia	< 100ms al servidor demo
Estabilidad	Sin interrupciones durante sesiones de testing
VPN	No requerida (sitio público)
Firewall	Permitir acceso a demo.prestashop.com



13. RESPONSABILIDADES

13.1. Estructura del Equipo

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

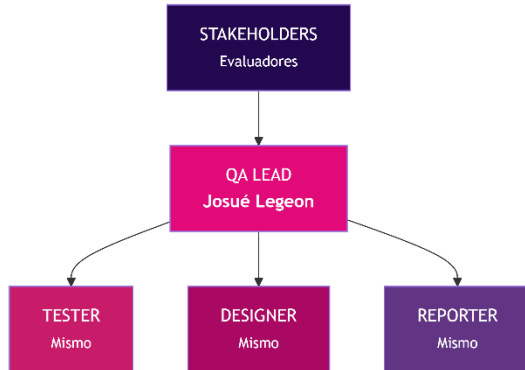

Roles y Responsabilidades Detalladas

QA Lead (Josué Legeon)

Responsabilidades Primarias:

Área	Responsabilidades
Planificación	• Crear plan de pruebas • Definir estrategia • Establecer cronograma • Identificar riesgos
Diseño	• Diseñar casos de prueba • Crear checklist • Preparar datos de prueba • Desarrollar matriz de trazabilidad
Ejecución	• Ejecutar casos de prueba • Reportar defectos • Capturar evidencias • Mantener métricas actualizadas
Reporte	• Generar reportes diarios • Crear reportes semanales • Producir reporte final • Presentar resultados
Gestión	• Gestionar cronograma • Controlar calidad • Mitigar riesgos • Comunicar con stakeholders

Tiempo de Dedicación:

- Planificación: 15% (5 días)
- Diseño: 20% (7 días)
- Ejecución: 40% (14 días)



- Reporte: 15% (5 días)
- Cierre: 10% (4 días)

14. CRONOGRAMA

Cronograma Master del Proyecto 20 Septiembre a 25 Octubre 2024

SEMANA 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO INICIAL

Días	Actividad	Duración	Estado
Día 1-2	Planificación del proyecto	2 días	
Día 3-4	Estrategia de testing	2 días	
Día 5-7	Diseño inicial de casos	3 días	

SEMANA 2: DISEÑO Y PREPARACIÓN

Días	Actividad	Duración	Estado
Día 8-10	Diseño de casos (continuación)	3 días	
Día 11-12	Matriz de trazabilidad	2 días	
Día 13-14	Preparación de ambiente y datos	2 días	

SEMANA 3: EJECUCIÓN FASE 1

Días	Actividad	Duración	Estado
Día 15	Smoke testing	1 día	
Día 16-18	Testing P0 (Crítico)	3 días	
Día 19-21	Testing P1 (Alto)	3 días	

SEMANA 4: EJECUCIÓN FASE 2 Y REGRESIÓN

Días	Actividad	Duración	Estado
Día 22-23	Testing P2 (Medio)	2 días	
Día 24-25	Testing exploratorio	2 días	
Día 26	Regresión	1 día	
Día 27-28	Re-testing de defectos	2 días	

SEMANA 5: REPORTES Y CIERRE

Días	Actividad	Duración	Estado
Día 29-30	Consolidación y análisis	2 días	
Día 31-32	Reportes finales	2 días	
Día 33-34	Documentación y archivo	2 días	
Día 35	Presentación y cierre	1 día	



15. RIESGOS Y CONTINGENCIAS

15.1. Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Score	Prioridad
R01	Sitio demo no disponible	Técnico	Media (40%)	Alto	8/10	● Alta
R02	Cambios en aplicación durante testing	Técnico	Media (50%)	Medio	6/10	● Alta
R03	Defectos no reproducibles	Técnico	Alta (60%)	Medio	7/10	● Alta
R04	Tiempo insuficiente	Planificación	Baja (30%)	Alto	5/10	● Media
R05	Pérdida de datos/evidencias	Técnico	Baja (20%)	Alto	4/10	● Media
R06	Limitaciones del ambiente demo	Técnico	Alta (70%)	Bajo	5/10	● Media
R07	Defectos bloqueantes múltiples	Calidad	Baja (25%)	Crítico	6/10	● Alta
R08	Incompatibilidad de navegadores	Técnico	Baja (20%)	Medio	3/10	● Baja
